



まちづくりニュース

(花月園競輪場跡地)



令和4年6月22日



発行：横浜市 環境創造局、都市整備局
UR都市機構 東日本都市再生本部

事業進捗状況について


日頃から本事業に対するご理解、ご協力をいただきありがとうございます。12m道路始点部等の工事を引き続き行うとともに、7月からは既設スロープの撤去工事に着手します。地域の皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

スロープ新設工事について

23号でご案内したスロープ架け替えに関連する工事について、7月上旬から、既存スロープを閉鎖し、解体工事に着手します。閉鎖期間中は、お手数ですが跨線橋に設置のエレベーター・階段をご利用いただき、迂回にご協力をお願いします。

現在のところ、新設スロープの一般開放は、都市計画法の手続により開発事業の工事完了公告(令和5年3月頃)後を予定しておりますが、引き続きスロープ工事の工程を短縮できるよう検討するとともにスロープ完成後には極力早く通行ができるよう調整を進めていきますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

7月以降の通行計画

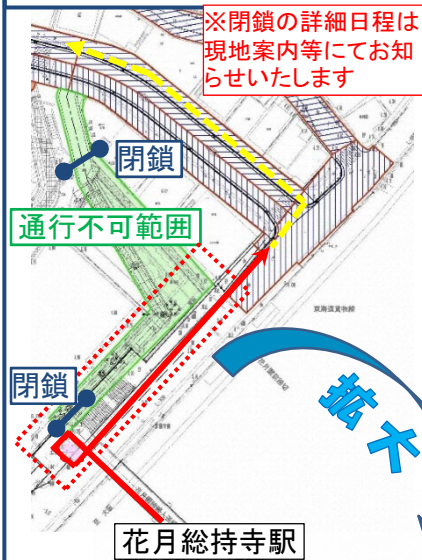


スロープ架け替え関連工事工程表(予定)

	2022年							2023年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備・山留橋台工事	[Blue arrow from June to August]									
スロープ自転車駐車場等工事		[Yellow arrow from July to March 2023]								

※工期につきましては諸官庁との協議や天候により変更となる場合がございます



迂回路計画

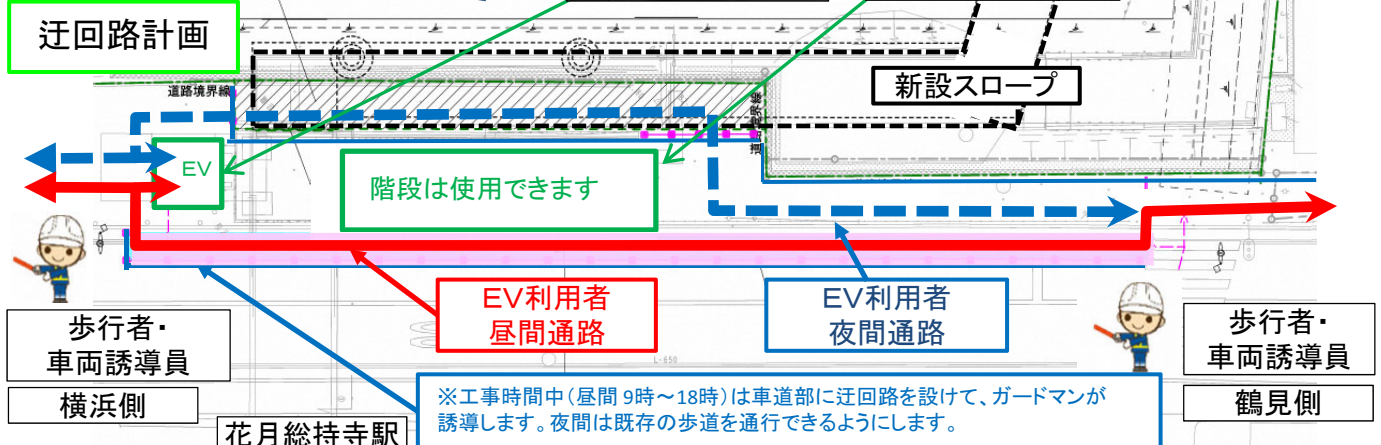

歩行者・
車両誘導員
横浜側

歩行者・
車両誘導員
鶴見側

※工事時間中(昼間9時~18時)は車道部に迂回路を設けて、ガードマンが誘導します。夜間は既存の歩道を通行できるようにします。

工事の状況について

12m道路始点部において一部の歩道が完成するなど、残りの工事を着実に進めております。地域の皆様には、振動や音を含めご不便、ご迷惑をおかけしていますが、安全第一で早期完成を目指して進めてまいりますので、引き続き、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

北側道路

東側道路部の工事を
施工中です

提供公園2

擁壁工事を
施工中です

プロムナード階段部、
法面部も施工中です

スロープ

階段

歩行者迂回路

スロープ閉鎖時
歩行者迂回路

市道429号線の道路築造工事は
完了しました

法面補強壁工事はパネル
設置が完了しました

12m道路始点部工事を
施工中です
一部の歩道が完成しました
(右側の歩道をご通行ください)

事業全体スケジュール(予定)

2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度
■鶴見花月園公園 (令和3年11月1日開園)				
12m道路				
宅地			集合住宅建設工事	
	北側道路			
	スロープ・自転車駐車場			

※スケジュールは整備予定を表しています。詳細は横浜市及びUR都市機構で調整し、改めてご案内します。

鶴見一丁目地区(花月園競輪場跡地)の状況はこちらでもご覧になれます
⇒<http://www.ur-net.go.jp/tsurumi>

(鶴見花月園公園の整備内容等について)

- 横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課 電話 045-671-4611
(地区全体のまちづくりの考え方について)
- 横浜市都市整備局 地域まちづくり部 地域まちづくり課 電話 045-671-2667
(地区全体の整備内容や事業スケジュール等について)
- UR都市機構 東日本都市再生本部
(計画関連) 事業推進部 事業推進第2課 電話 03-5323-0678
(工事関連) 基盤整備計画部 基盤統括課 電話 03-5323-0848
(工事について)
- (UR工事) UR鶴見一丁目地区工事監督員事務所 電話 0120-454-081 電話 080-1036-0238
(民間JV工事) 花月園造成作業所 電話 045-717-9802
(スロープ工事について)
- 大末建設(株)(仮称)花月園駅前スロープ解体新設工事作業所 電話 045-633-4348
