

まちづくりニュース (花月園競輪場跡地)



令和4年8月30日



発行：横浜市 環境創造局、都市整備局
UR都市機構 東日本都市再生本部

事業進捗状況について

日頃から本事業に対するご理解、ご協力をいただきありがとうございます。12m道路始点部やスロープの工事を引き続き実施しているところです。地域の皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

12m道路(始点部)工事の施工状況について

今年1月に着手した12m道路(始点部)工事についてですが、①ブロック～③ブロックまで終了し、現在④ブロックを施工しています。これまでの工事において、現道の地中から不明管が発見されるなど予期せぬ作業の発生等により施工に時間を要し、当初予定の工期(9月末)に遅れが生じています。④ブロック～⑧ブロックの工事内容等に応じて工事工程を見直した結果、12月末頃までかかる予定です。今後は、遅延が生じないように、工程管理の再徹底を実施するとともに 引き続き安全な通行帯を確保しながら工事を進めてまいります。

施工展開：①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧

※車道部は、基層にて暫定開放、表層(最終舗装)は一括施工

⑦ブロック整備内容

- ・車道・歩道整備
- ・転落防止柵設置

11月上旬頃～12月下旬頃

⑥ブロック整備内容

- ・電柱移設
- ・既設下水道撤去
- ・ガス管敷設
- ・車道・歩道整備

10月上旬頃～11月上旬頃

④ブロック整備内容

- ・電柱移設
- ・ガス管敷設
- ・車道・歩道整備

6月中旬～9月上旬頃 施工中

⑤ブロック整備内容


- ・車道・歩道整備

8月下旬頃～10月上旬頃

施工済みブロック

- ①ブロック：八幡前二見台線改築
- ②ブロック：歩道部・車道部(基層)
- ③ブロック：歩道部・車道部(基層)

※各ブロックの工程は、現場状況等によって見直すことがあります。

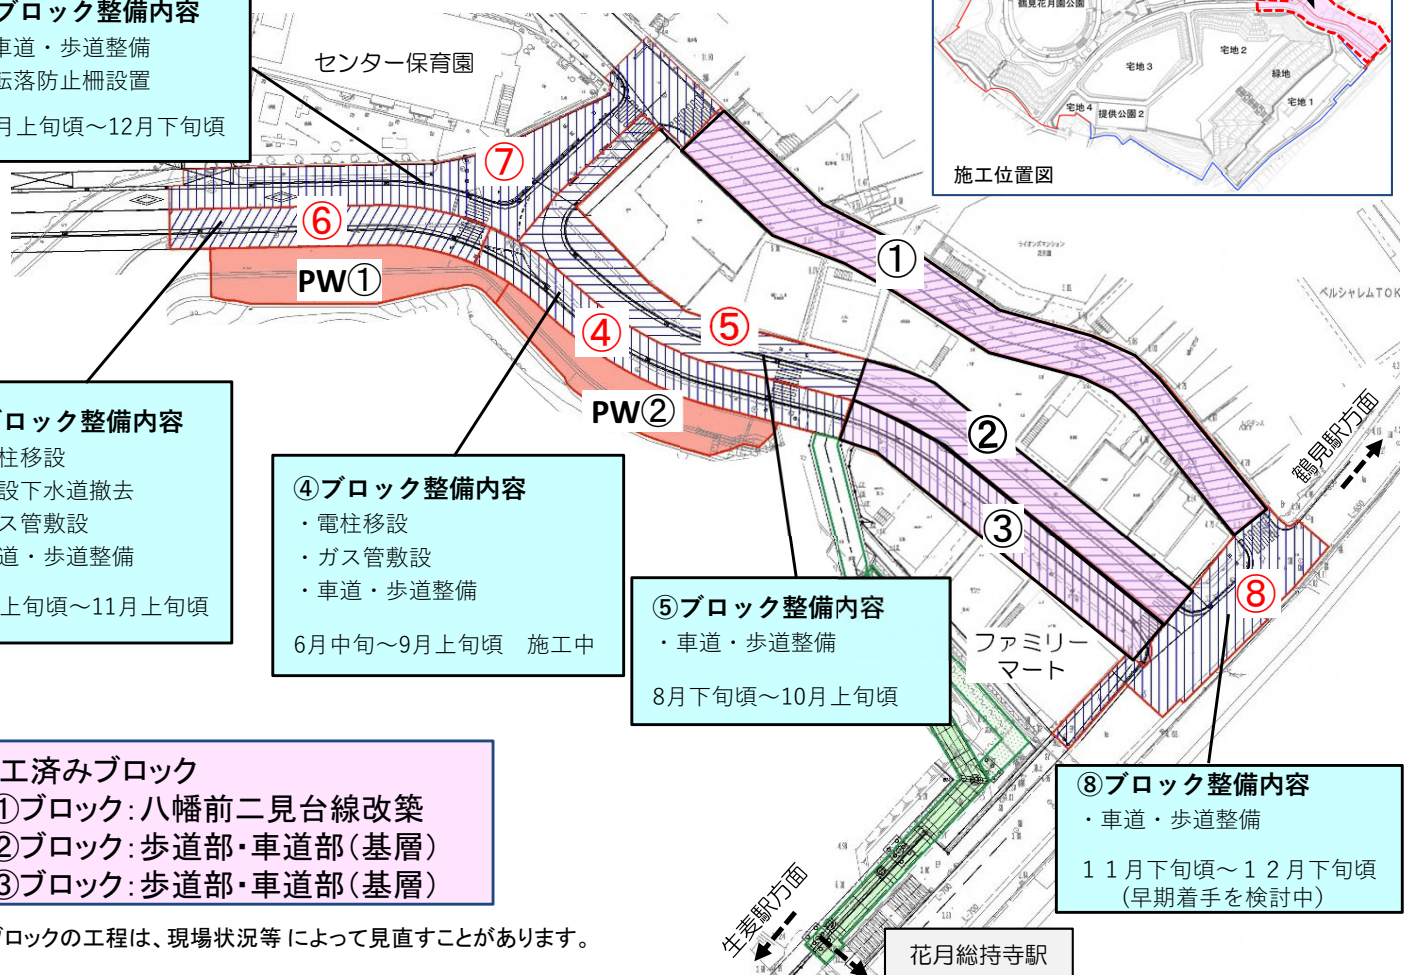

花月総持寺駅

工事の状況について

12m道路始点部において一部の歩道が完成するなど、残りの工事を着実に進めております。地域の皆様には、振動や騒音を含めご不便、ご迷惑をおかけしていますが、安全第一で早期完成を目指して進めてまいりますので、引き続き、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



※スロープ工事による歩道の通行規制は、9月中旬から実施する予定です。

事業全体スケジュール(予定)

2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度
■ 鶴見花月園公園 (令和3年11月1日開園)				
12m道路				
宅地			集合住宅建設工事	
	北側道路			
	スロープ・自転車駐車場			

※スケジュールは整備予定を表しています。使用開始時期は関係者間にて調整し、改めてご案内します。

鶴見一丁目地区(花月園競輪場跡地)の状況はこちらでもご覧になれます
⇒<http://www.ur-net.go.jp/tsurumi>

(鶴見花月園公園の整備内容等について)

■横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話 045-671-4611

(地区全体のまちづくりの考え方について)

■横浜市都市整備局 地域まちづくり部 地域まちづくり課

電話 045-671-2667

(地区全体の整備内容や事業スケジュール等について)

■UR都市機構 東日本都市再生本部

(計画関連) 事業推進部 事業推進第2課

電話 03-5323-0678

(工事関連) 基盤整備計画部 基盤統括課

電話 03-5323-0848

(工事について)

(UR工事) UR鶴見一丁目地区工事監督員事務所

電話 0120-454-081 電話 080-1036-0238

(民間JV工事) 花月園造成作業所

電話 045-717-9802

(スロープ工事について)

■大末建設(株)(仮称)花月園駅前スロープ解体新設工事作業所

電話 045-633-4348
