

受付 番号	種目番号	連絡先	委託担当
	350		課名 港湾局 客船事業推進課 担当者 樋口 貴晴 係名 電 話 671-7272

設 計 書

- 1 委託名 大黒ふ頭での客船受入れに係る施設内及び周辺等の設営等業務委託
- 2 履行場所 横浜市鶴見区大黒ふ頭
- 3 履行期間
又は期限 期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
 期限 _____
- 4 契約区分 確定契約 概算契約
- 5 その他特約事項 仕様書記載のとおり
- 6 現場説明 不要
 要(月 日 時 分 場所)
- 7 委託概要 大黒ふ頭での客船受入れに際し、客船ターミナル等の施設内及び周辺等の設営、当日転換、撤去等を行うこと。

金額抜き

委託代金額						¥ ()
内訳 業務価格						¥ ()
消費税及び地方消費税相当額						¥ ()
部分払い <input checked="" type="checkbox"/> する(12回以内) <input type="checkbox"/> しない 部分払いの基準						
業務内容	履行予定月	数量 (概算数量)	単位	単価	金額 (概算金額)	
業務委託料	4月	1	式		()	
業務委託料	5月	1	式		()	
業務委託料	6月	1	式		()	
業務委託料	7月	1	式		()	
業務委託料	8月	1	式		()	
業務委託料	9月	1	式		()	
業務委託料	10月	1	式		()	
業務委託料	11月	1	式		()	
業務委託料	12月	1	式		()	
業務委託料	1月	1	式		()	
業務委託料	2月	1	式		()	
業務委託料	3月	1	式		()	
防災用仮設テント (天幕取付け)	4~3月	(1)	回		()	
防災用仮設テント (天幕取外し)	4~3月	(1)	回		()	

※かっこ内の数字は、概算数量

内 訳 書

名称	形状寸法等	数量	単位	単価	金額	摘要
1 施設内及び周辺		1	式	()	()	詳細は別表1のとおり
2 テント及び屋根付き通路		1	式	()	()	
小計					()	
消費税					()	
委託金額合計					()	

※かっこ内の数字は、概算数量

別表 1

名称	形状寸法等	数量	単位	単価	金額	摘要
1 施設内及び周辺					()	
設営(1隻当たり)		(23)	回		()	
設営(一部・1隻当たり)		(3)	回		()	直前に寄港していた客船が同一船であり、施設内の各備品が概ね残置されている場合
当日転換(1隻当たり)		(8)	回		()	
撤去(1隻当たり)		(20)	回		()	
2 テント及び屋根付き通路					()	
防災用仮設テント(式)	設営	(20)	回		()	
	設営(一部)	(6)	回		()	上屋(保管場所)からの運搬を伴わない場合
	撤去	(20)	回		()	
	天幕取付け	(1)	回		()	
	天幕取外し	(1)	回		()	
屋形テント(式)	設営	(20)	回		()	
	設営(一部)	(6)	回		()	上屋(保管場所)からの運搬を伴わない場合
	撤去	(20)	回		()	
屋根付き通路(式)	設営	(8)	回		()	
	設営(一部)	(18)	回		()	上屋(保管場所)からの運搬を伴わない場合
	撤去	(9)	回		()	
	撤去(一部)	(17)	回		()	上屋(保管場所)への運搬を伴わない場合

※かっこ内の数字は、概算数量

別表 2

No.	年	月	着岸予定日時			離岸予定日時			船名	寄港種別	設営開始予定時間 及び完了期限		撤去開始予定時間 及び完了期限	
			日	時	分	日	月	時			上段：開始時間 下段：完了期限	上段：開始時間 下段：完了期限		
1	7	4	7	月	6:30	7	月	19:00	クイーン・エリザベス	発着	4月6日 15:00 4月6日 18:30	4月7日 18:30 4月7日 20:30		
2	7	4	16	水	6:30	16	水	19:00	クイーン・エリザベス	発着	4月15日 15:00 4月15日 18:30	4月16日 18:30 4月16日 20:30		
3	7	4	24	木	13:30	25	金	19:00	アンセム・オブ・ザ・シーズ	一時寄港	4月23日 15:00 4月23日 19:00	(連続寄港に際し後船の設 営で対応を想定)		
4	7	4	26	土	6:30	26	土	19:00	クイーン・エリザベス	発着	4月25日 19:00 4月25日 21:30	4月26日 18:30 4月26日 20:30		
5	7	5	5	月	6:30	5	月	19:00	クイーン・エリザベス	発着	5月4日 15:30 5月4日 18:00	5月5日 18:30 5月5日 21:00		
6	7	5	13	火	5:30	13	火	19:00	MSCベリッシマ	発着	5月12日 15:00 5月12日 19:00	5月13日 18:00 5月13日 20:00		
7	7	5	14	水	6:30	14	水	19:00	クイーン・エリザベス	発着	5月13日 19:00 5月13日 21:30	(連続寄港に際し後船の設 営で対応を想定)		
8	7	5	15	木	6:30	15	木	19:00	オペーション・オブ・ザ・シーズ	発着	5月14日 19:00 5月14日 22:00	5月15日 18:00 5月15日 21:00		
9	7	5	24	土	6:30	24	土	19:00	クイーン・エリザベス	発着	5月23日 15:00 5月23日 19:00	5月24日 18:30 5月24日 21:00		
10	7	6	12	木	13:30	12	木	23:00	スペクトラム・オブ・ザ・シーズ	一時寄港	6月11日 15:00 6月11日 19:00	6月12日 22:00 6月13日 1:00		
11	7	7	1	火	6:30	1	火	17:00	セレブリティ・ミレニアム	発着	6月30日 15:00 6月30日 19:00	7月1日 16:00 7月1日 19:00		
12	7	7	30	水	13:30	30	水	23:00	スペクトラム・オブ・ザ・シーズ	一時寄港	7月29日 15:00 7月29日 19:00	7月30日 22:00 7月31日 1:00		
13	7	8	16	土	7:30	17	日	9:00	パシフィック・ワールド	発着	8月15日 15:00 8月15日 19:00	(連続寄港に際し後船の設 営で対応を想定)		
14	7	8	18	月	6:30	18	月	17:00	セレブリティ・ミレニアム	発着	8月17日 9:00 8月17日 13:00	8月18日 16:00 8月18日 19:00		
15	7	9	18	木	13:30	18	木	23:00	スペクトラム・オブ・ザ・シーズ	一時寄港	9月17日 15:00 9月17日 19:00	9月18日 22:00 9月19日 1:00		
16	7	10	3	金	7:30	3	金	23:00	カーニバル・ルミノーザ	一時寄港	10月2日 15:00 10月2日 19:00	(連続寄港に際し後船の設 営で対応を想定)		
17	7	10	4	土	7:30	5	日	17:00	ノルウェージャン・スピリット	発着	10月3日 22:30 10月4日 2:00	10月5日 16:30 10月5日 18:30		
18	7	10	9	木	6:30	9	木	19:00	オペーション・オブ・ザ・シーズ	発着	10月8日 15:00 10月8日 19:00	10月9日 18:00 10月9日 21:00		
19	7	10	13	月	6:30	14	火	16:00	ディスカバリー・プリンセス	発着	10月12日 15:00 10月12日 19:00	10月14日 15:30 10月14日 18:30		
20	7	11	3	月	6:30	3	月	16:00	ダイヤモンド・プリンセス	発着	11月2日 15:00 11月2日 19:00	11月3日 15:30 11月3日 18:00		
21	8	1	4	日	6:30	5	月	19:00	ジャオ・シャン・イドウン	発着	1月3日 15:00 1月3日 18:30	1月5日 18:30 1月5日 20:30		
22	8	3	12	木	13:30	12	木	23:00	スペクトラム・オブ・ザ・シーズ	一時寄港	3月11日 15:00 3月11日 19:00	3月12日 22:00 3月13日 1:00		
23	8	3	16	月	6:30	16	月	19:00	ジャオ・シャン・イドウン	発着	3月15日 15:00 3月15日 18:30	3月16日 18:30 3月16日 20:30		
24	8	3	24	火	5:30	24	火	19:00	MSCベリッシマ	発着	3月23日 15:00 3月23日 19:00	3月24日 18:00 3月24日 20:00		
25	8	3	25	水	13:30	25	水	23:00	スペクトラム・オブ・ザ・シーズ	一時寄港	3月24日 19:00 3月24日 22:00	3月25日 22:00 3月26日 1:00		
26	8	3	28	土	6:30	28	土	19:00	セレブリティ・ミレニアム	発着	3月27日 15:00 3月27日 19:00	3月28日 18:00 3月28日 21:00		

※客船の寄港スケジュール等に応じて、変更が生じる場合があります。

大黒ふ頭での客船受入れに係る施設内及び周辺等の設営等業務委託 仕様書

本仕様書は、横浜市（以下「委託者」という。）が受託者に委託する大黒ふ頭での客船受入れに必要な設営等の業務について必要な事項を定める。

1 業務目的

本業務は、大黒ふ頭客船ターミナル等の施設内及び周辺等の設営、当日転換、撤去等を行うことで、大黒ふ頭に寄港する客船の受入業務の円滑化を目的とする。

2 履行場所

横浜市鶴見区大黒ふ頭（別紙1参照）

3 履行期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

4 用語の定義

- (1) 設営とは、客船の寄港に備えて、委託者が指定するレイアウトをもとに各備品を運搬及び配置等することをいう。
- (2) 当日転換とは、客船の寄港中に特定の時間帯を利用して、委託者が指定するレイアウトをもとに各備品の配置等を一部変更することをいう。
- (3) 撤去とは、客船の離岸等に際して、設営等で用いた各備品を委託者が指定する場所へ運搬等することをいう。
- (4) 残置とは、客船の離岸等に際して、設営等で用いた各備品を委託者の指示のもと撤去せずに残しておくことをいう。
- (5) 連続寄港とは、客船の離岸から翌々日までの間に、客船が新たに寄港することをいう。

5 業務内容等

(1) 体制の確保

受託者は、客船の寄港スケジュールの変更や悪天候等に起因して、業務内容に影響が及ぶ可能性があることを踏まえ、委託者からの急な求めにも柔軟に対応できる体制の確保に努めること。

(2) 備品の取扱い

受託者は原則として、別紙2に示す委託者が保有する備品を使用すること。また、設営、当日転換、撤去に必要な資機材で、別紙2に示されていないもの（フォークリフト、トラック、かご台車、無線機等）については、受託者の負担で用意すること。

なお、備品の運搬に際しては、フォークリフト、トラックを使用することができるが、フォークリフトを用いてパレット以外の備品を運搬する場合は、フォーク部分を古毛布等で養生すること。その他の方法で運搬する際にも、備品や設置物に破損等が生じないように、十分に留意して取り扱うこと。

(3) 設営

ア レイアウト

大黒ふ頭客船ターミナル、大黒ふ頭T-3号上屋及びT-4号上屋の各施設内及び周辺の基本となるレイアウト例は、別紙3から8のとおり。委託者は寄港毎にあらかじめ、受

託者にレイアウト図等を示すものとする。ただし、直前に寄港していた客船の受入れにおける撤去、残置状況等によっては、同様のレイアウトであっても作業量に差が生じるため、受託者はこの点について留意すること。

なお、作業当日の状況によっては、予定内容から変更が必要となる場合があるため、受託者はその場合においても、委託者の指示に従うこと。

イ 作業時間等

受託者は、作業に必要な人員を想定し従事者を確保の上、別表2に示す開始時間から完了期限までに完了すること。この際、作業時間帯が深夜に及ぶ場合があるほか、客船の寄港スケジュール等に応じて、開始時間及び完了期限に変更が生じる場合がある。

なお、受託者は作業を完了した後、その旨を委託者に報告し確認を求めること。また、その際に不備が認められた場合は、速やかに対処すること。

ウ その他詳細

作業内容には、X線検査装置や金属探知機等の電源ケーブル、延長コード、LANケーブル等の配線及び養生を含む。また、夏季においては冷風機の給水及び設置を行うことがある。

(4) 当日転換

ア レイアウト

委託者は寄港毎にあらかじめ、受託者にレイアウト図等を示すものとする（作業前後のイメージの比較は、別紙5及び6、別紙7及び8を各参照）。

なお、作業当日の状況によっては、予定内容から変更が必要となる場合があるため、受託者はその場合においても、委託者の指示に従うこと。

イ 作業時間等

受託者は、作業に必要な人員を想定し従事者を確保の上、委託者が別途示す開始時間から完了期限までに完了すること。この際、客船の寄港スケジュール等に応じて、開始時間及び完了期限に変更が生じる場合がある。

なお、受託者は作業を完了した後、その旨を委託者に報告し確認を求めること。また、その際に不備が認められた場合は、速やかに対処すること。

(5) 撤去

ア 各備品の運搬先

委託者は寄港毎にあらかじめ、受託者に各備品の運搬先を示すものとする。各備品の運搬先は、設営前に位置していた場所を基本とするが、連続寄港時などには作業効率を考慮し、一部又は全部を残置する場合がある。

なお、作業当日の状況によっては、予定内容から変更が必要となる場合があるため、受託者はその場合においても、委託者の指示に従うこと。

イ 作業時間等

受託者は、作業に必要な人員を想定し従事者を確保の上、別表2に示す開始時間から完了期限までに完了すること。この際、作業時間帯が深夜に及ぶ場合があるほか、客船の寄港スケジュール等に応じて、開始時間及び完了期限に変更が生じる場合がある。

なお、受託者は作業を完了した後、その旨を委託者に報告し確認を求めること。また、その際に不備が認められた場合は、速やかに対処すること。

ウ その他詳細

受託者は、客船の寄港に伴い生じたと判断されるごみ等を発見した場合は、それらを収集・分別し、委託者の指定する集積場所に運搬すること。

(6) 安全対策

受託者は、設営等の実施に際し、安全対策として次の措置を講じること。

ア 防災用仮設テントは、強風等による倒壊や移動の未然防止を図るため、各支柱に専用のウェイトプレート及びウェイトを据え付ける。さらに、原則として当該ウェイト上に屋形テント用のウェイトを追加で据え付ける。

なお、設営後に強風が吹き続けることが生じた場合は、天幕（屋根・側面）を取り外して骨組みのみとするなど、現場状況を踏まえて適切に対処する。

イ 屋形テントは、強風等による倒壊や移動の未然防止を図るため、各支柱に専用のウェイトを据え付ける。

ウ その他備品等については必要に応じて、強風等による倒壊や移動の未然防止を図る。

エ 横浜地方気象台による気象警報・注意報を随時確認し、風速12mを超える場合や作業員の安全を確保することが困難な場合は委託者に速やかに報告し、委託者が作業の中止や防災用仮設テントの天幕の取外し及び撤去等を判断した場合には、その指示に従う。

6 損害賠償

本業務の遂行にあたっては、法令等を遵守し事故の防止に万全の注意を払うこと。受託者が本仕様書に定める安全対策を怠り、委託者又は第三者に損害を与えたときは、受託者が責任を持って賠償の責に任ずるものとする。

7 その他

(1) 履行場所は「海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS条約）」における制限区域内に所在するため、制限区域に立ち入る際は、本人確認書類を所持し、ゲート警備員の指示に従うこと。

(2) 作業従事者は、作業しやすい服装で、安全帽、手袋などを着用し、怪我の防止に努めること。

(3) 受託者は、備品や施設等に破損等を生じさせた場合は、直ちに委託者へ報告するとともに、現状復帰等について速やかに対処すること。

(4) 客船の寄港日時の変更や、寄港の追加又は中止が生じた際には、委託者は受託者にその旨を伝達するものとする。

(5) 客船の寄港スケジュールの変更等によって作業が中止となった際に、受託者において作業員の確保、物品調達等に関する費用が既に発生していた場合は、委託者はこれを支払うことができる。ただし、受託者がその費用支払を証する書類を委託者へ提出し、その確認を受けなければならない。

(6) 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書の内容等に疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。

履行場所

別紙 1




備品リスト


No.	名称	仕様等	数量
1	インフォメーションカウンター	ライオン事務器 DX型DX-18100U W1800×D840×H1000	54台
2	長机	TOKIO・TCT-1860 アイボリー W1800×D600	115台
3	脚折りたたみテーブル用台車(10台用)	TOKIO・FDT W1950×D700×H1130	11台
4	作業台(税関使用)	サカエ KK-187F1G W1800×D750×H740	10台
5	椅子	アイリステトセ LTS-110-V、TOKIO NSC-15L	1,000脚
6	スタッキングチェア台車(30脚用)	TOKIO DN-30 W588×D682×H752mm	34台
7	ベルトパーテーション	テラモト・スタンドSE(ステンレス) ベルト長1700	750本
8	三つ折りパーティション	コマイ TP3-1809BN-FFYY H1800×W2700mm	250台
9	コンベア式X線検査装置(中型)	Astorophysics XIS-7858	6台
10	コンベア式X線検査装置(大型)	IHI検査計測・IXI-100100T-N	4台
11	ゲート式金属探知機	Ceia HI-PE Multi-Zone	8台
12	手荷物カート	花岡車輛 PC-70Ⅲ	70台
13	延長コード類	ハタヤリミテッド・SS-30K、サンワサプライ・TAP-MG341N2PN-5	5個
14	屋形テント	加藤・GK屋型テント GK2号型ポリエステル帆布白防水	50張
15	防災用仮設テント	W5000×L6000×H2600	52張
16	携帯式非常用照明	40W蛍光灯	13個
17	発電機(ホンダ)	900VA ホンダ・EU28iS1JNA3(車輪付)	13台
18	大型発電機	デンヨー・DCA-45ES	20台
19	重し(テント用丸型20kg)	加藤・KTウエイト 鋳物20kg	720個
20	重し(四角型)		600個
21	屋根付き通路(エプロンルーフ)	協和エクシオ	160基
22	屋根付き通路用ライト(V-フリーライト屋外用)	レンカライト ハタヤFPX-5 40W×4本セット	10個
23	電動牽引車	三菱ロジスネクスト NTT75RS-70-Z	2台
24	カラーコーン(重量型)	トーグ安全工業・SEA-70AWH 高さ700mm	2,000本
25	コーンバー(1.5m)	34φ×1500mm	1,300本
26	コーンバー(2.0m)	34φ×2000mm	1,300本
27	カラーフェンス(緑色)	プラスト興業・AKF-1、FB、樹脂製フェンス連結部	200個
28	カラーフェンス(緑色)連結コンクリート台等	プラスト興業 FB	200個
29	段差解消スローププレート	トラスコ中山・GM5L-1200 W760mm×H20mm	12個
30	段差解消スローププレート	W1000mm×H20mm	6個
31	フロアスタンド(L型スタンド)	友屋 ブラック	100本
32	案内表示板設置器具(Aバリアケード)		9本
33	パレット	サンコー・SKD412122BL 1200mm×1200mm×150mm	65台
34	リフター(手動)	コレック・NDAJ15	1台
35	リフター(電動)	ピシャモン・BDH15-60M	1台
36	気化式冷風機		4台
37	大型扇風機	ナカトミ BF-75V	8台

※仕様や数量に変更が生じる場合あり。


【大黒ふ頭レイアウト例（一隻の時）】

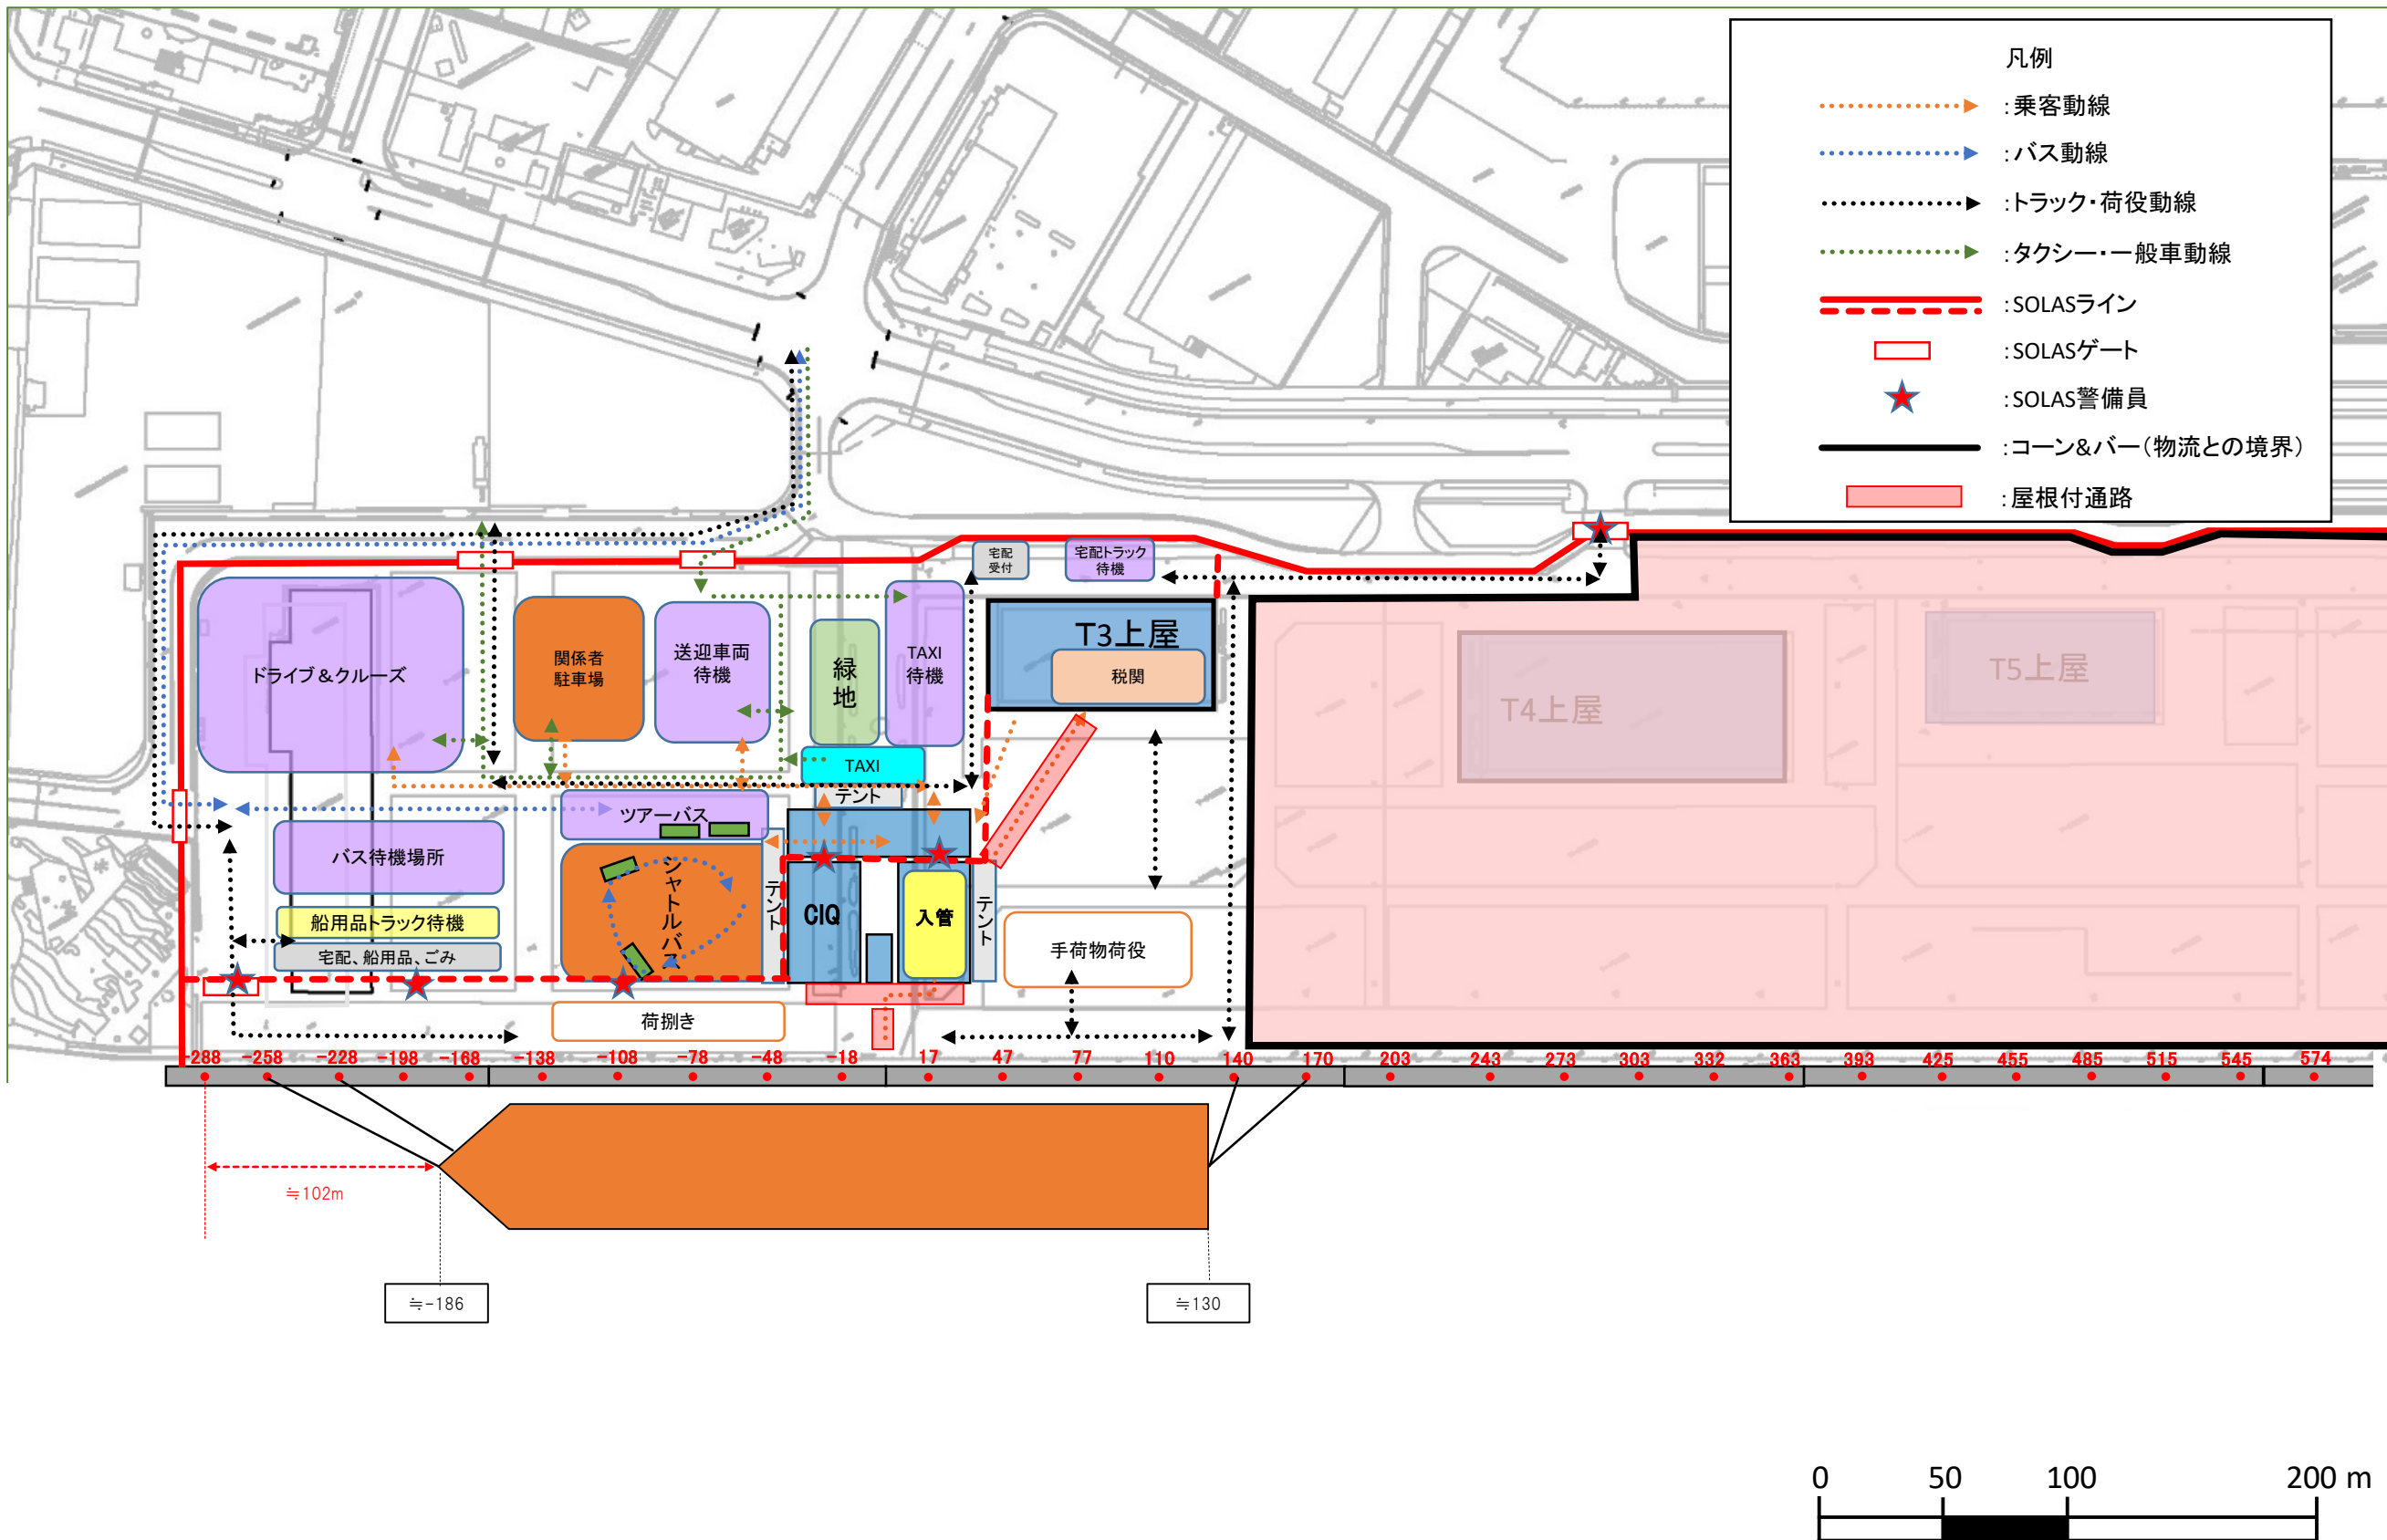

【大黒ふ頭レイアウト例（二隻の時）】

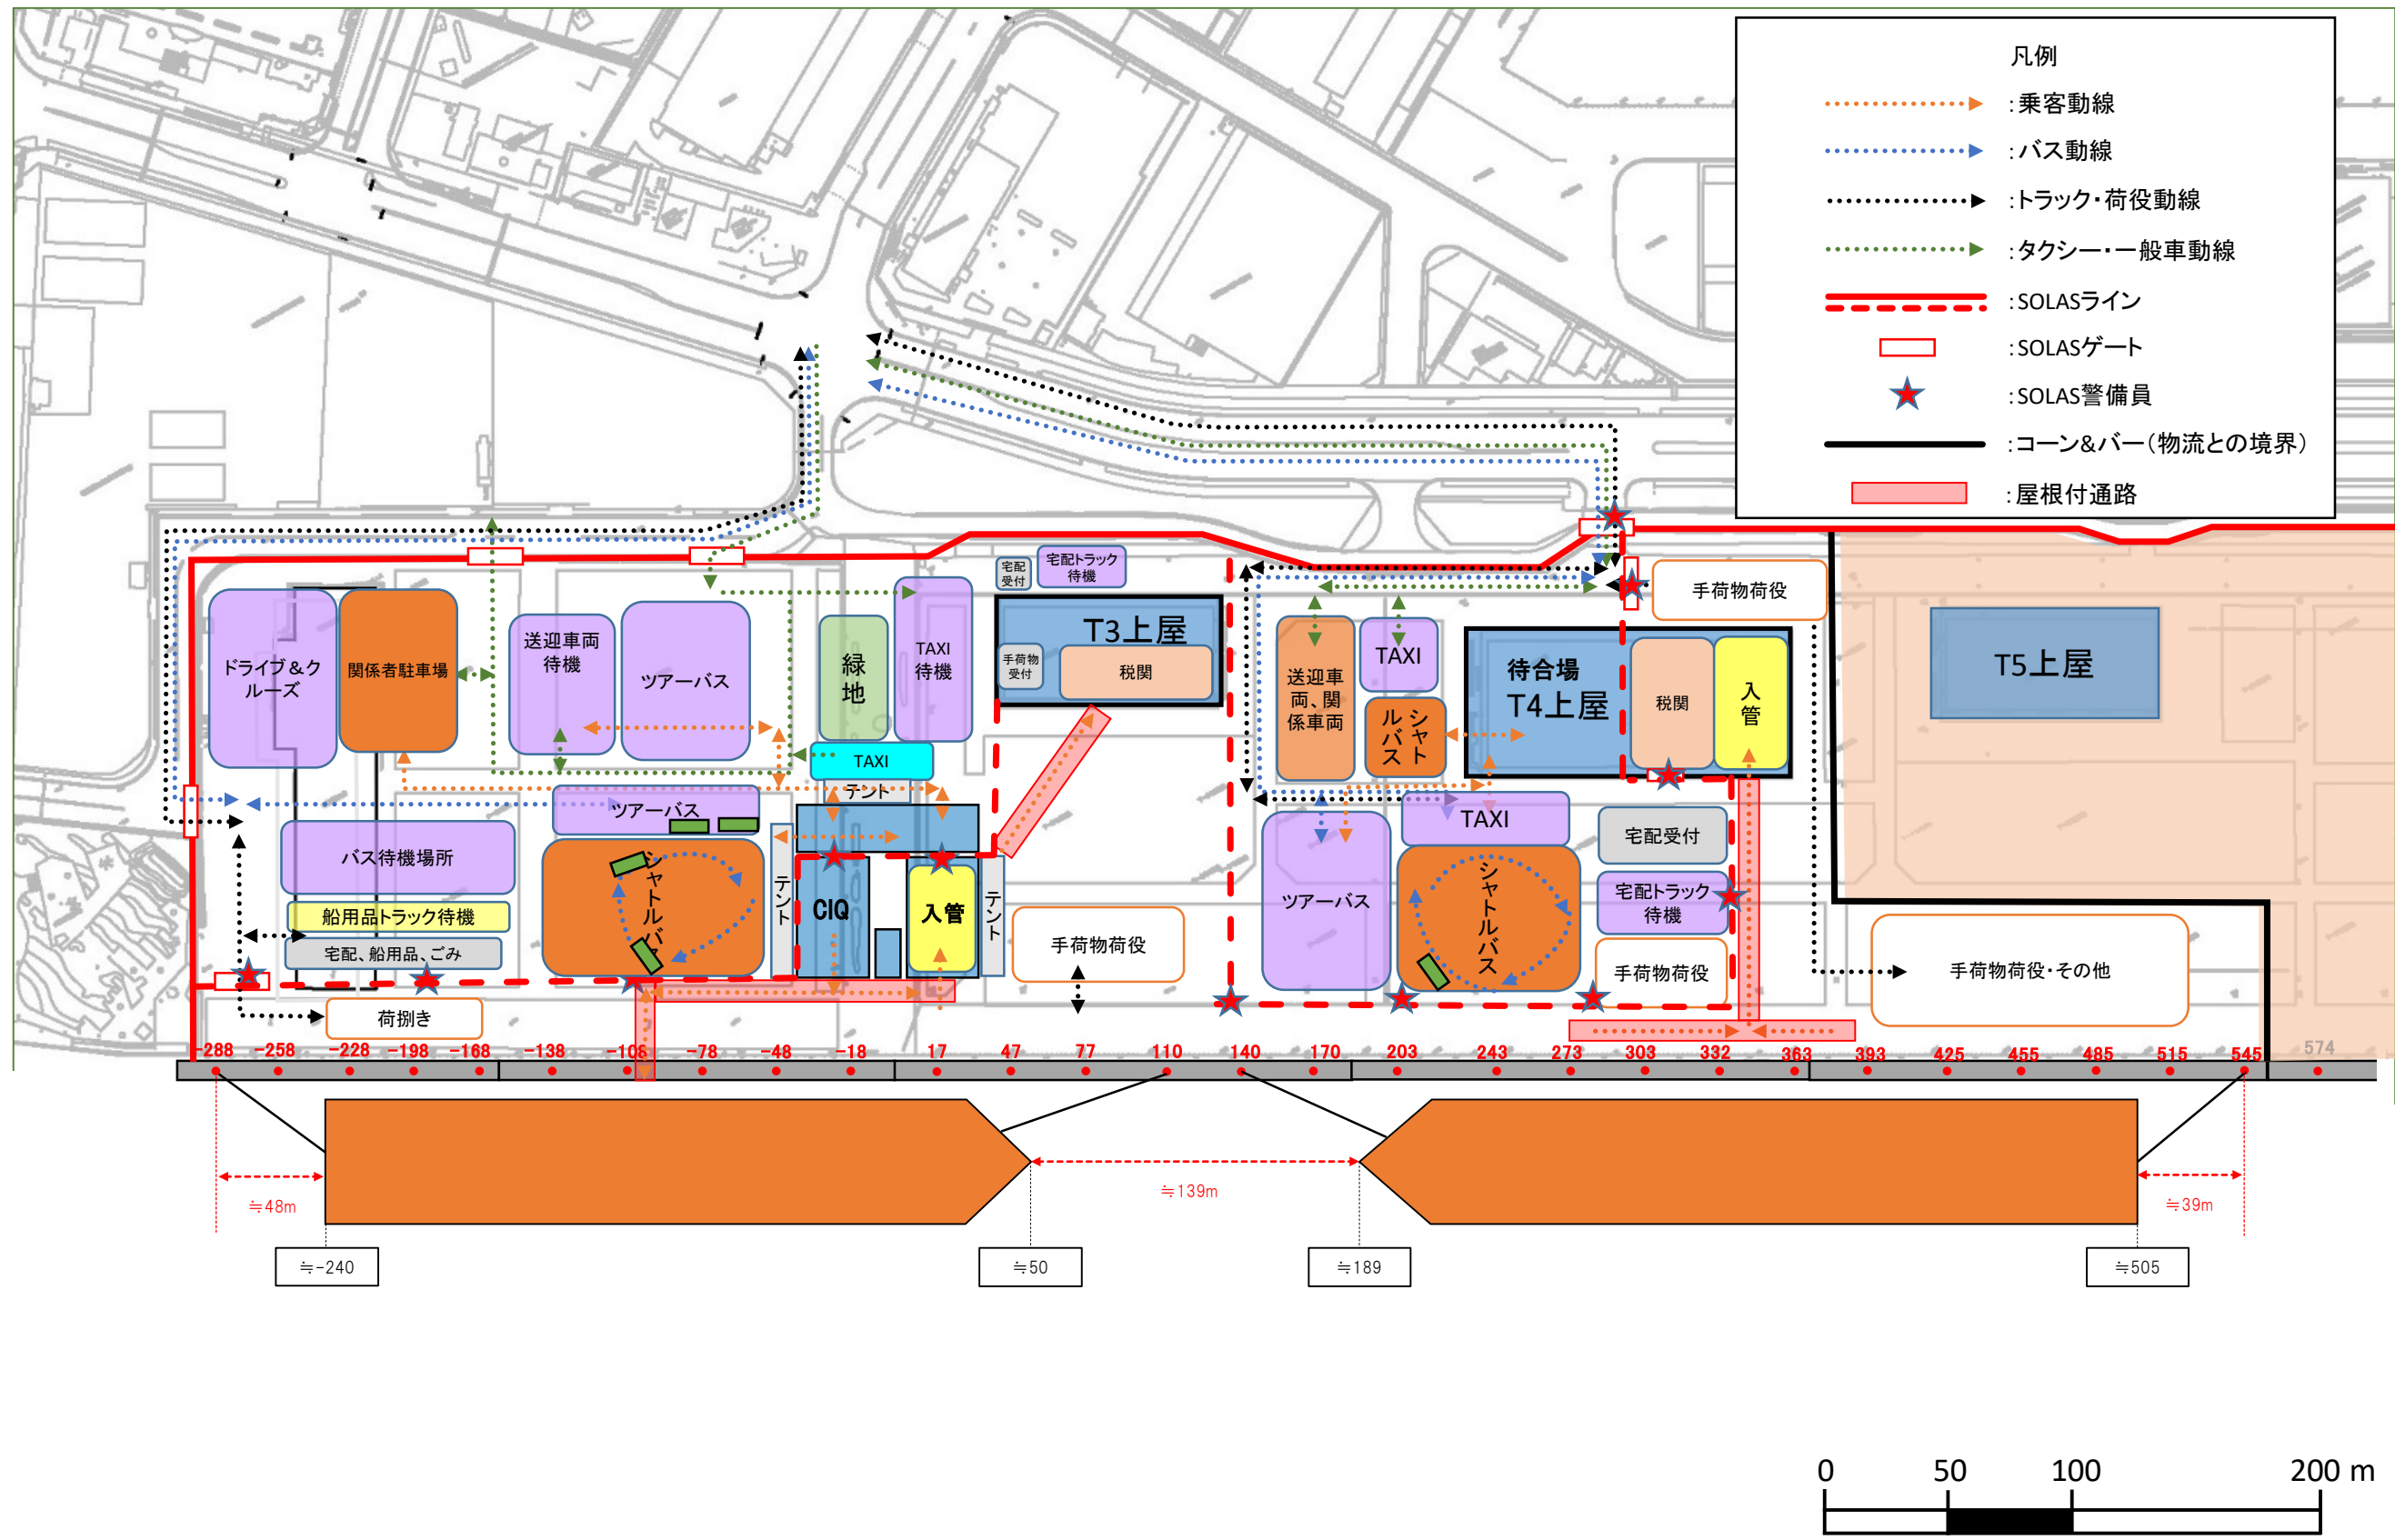

客船ターミナルとT-3号上屋（前港国外）
下船時レイアウト例（転換前）

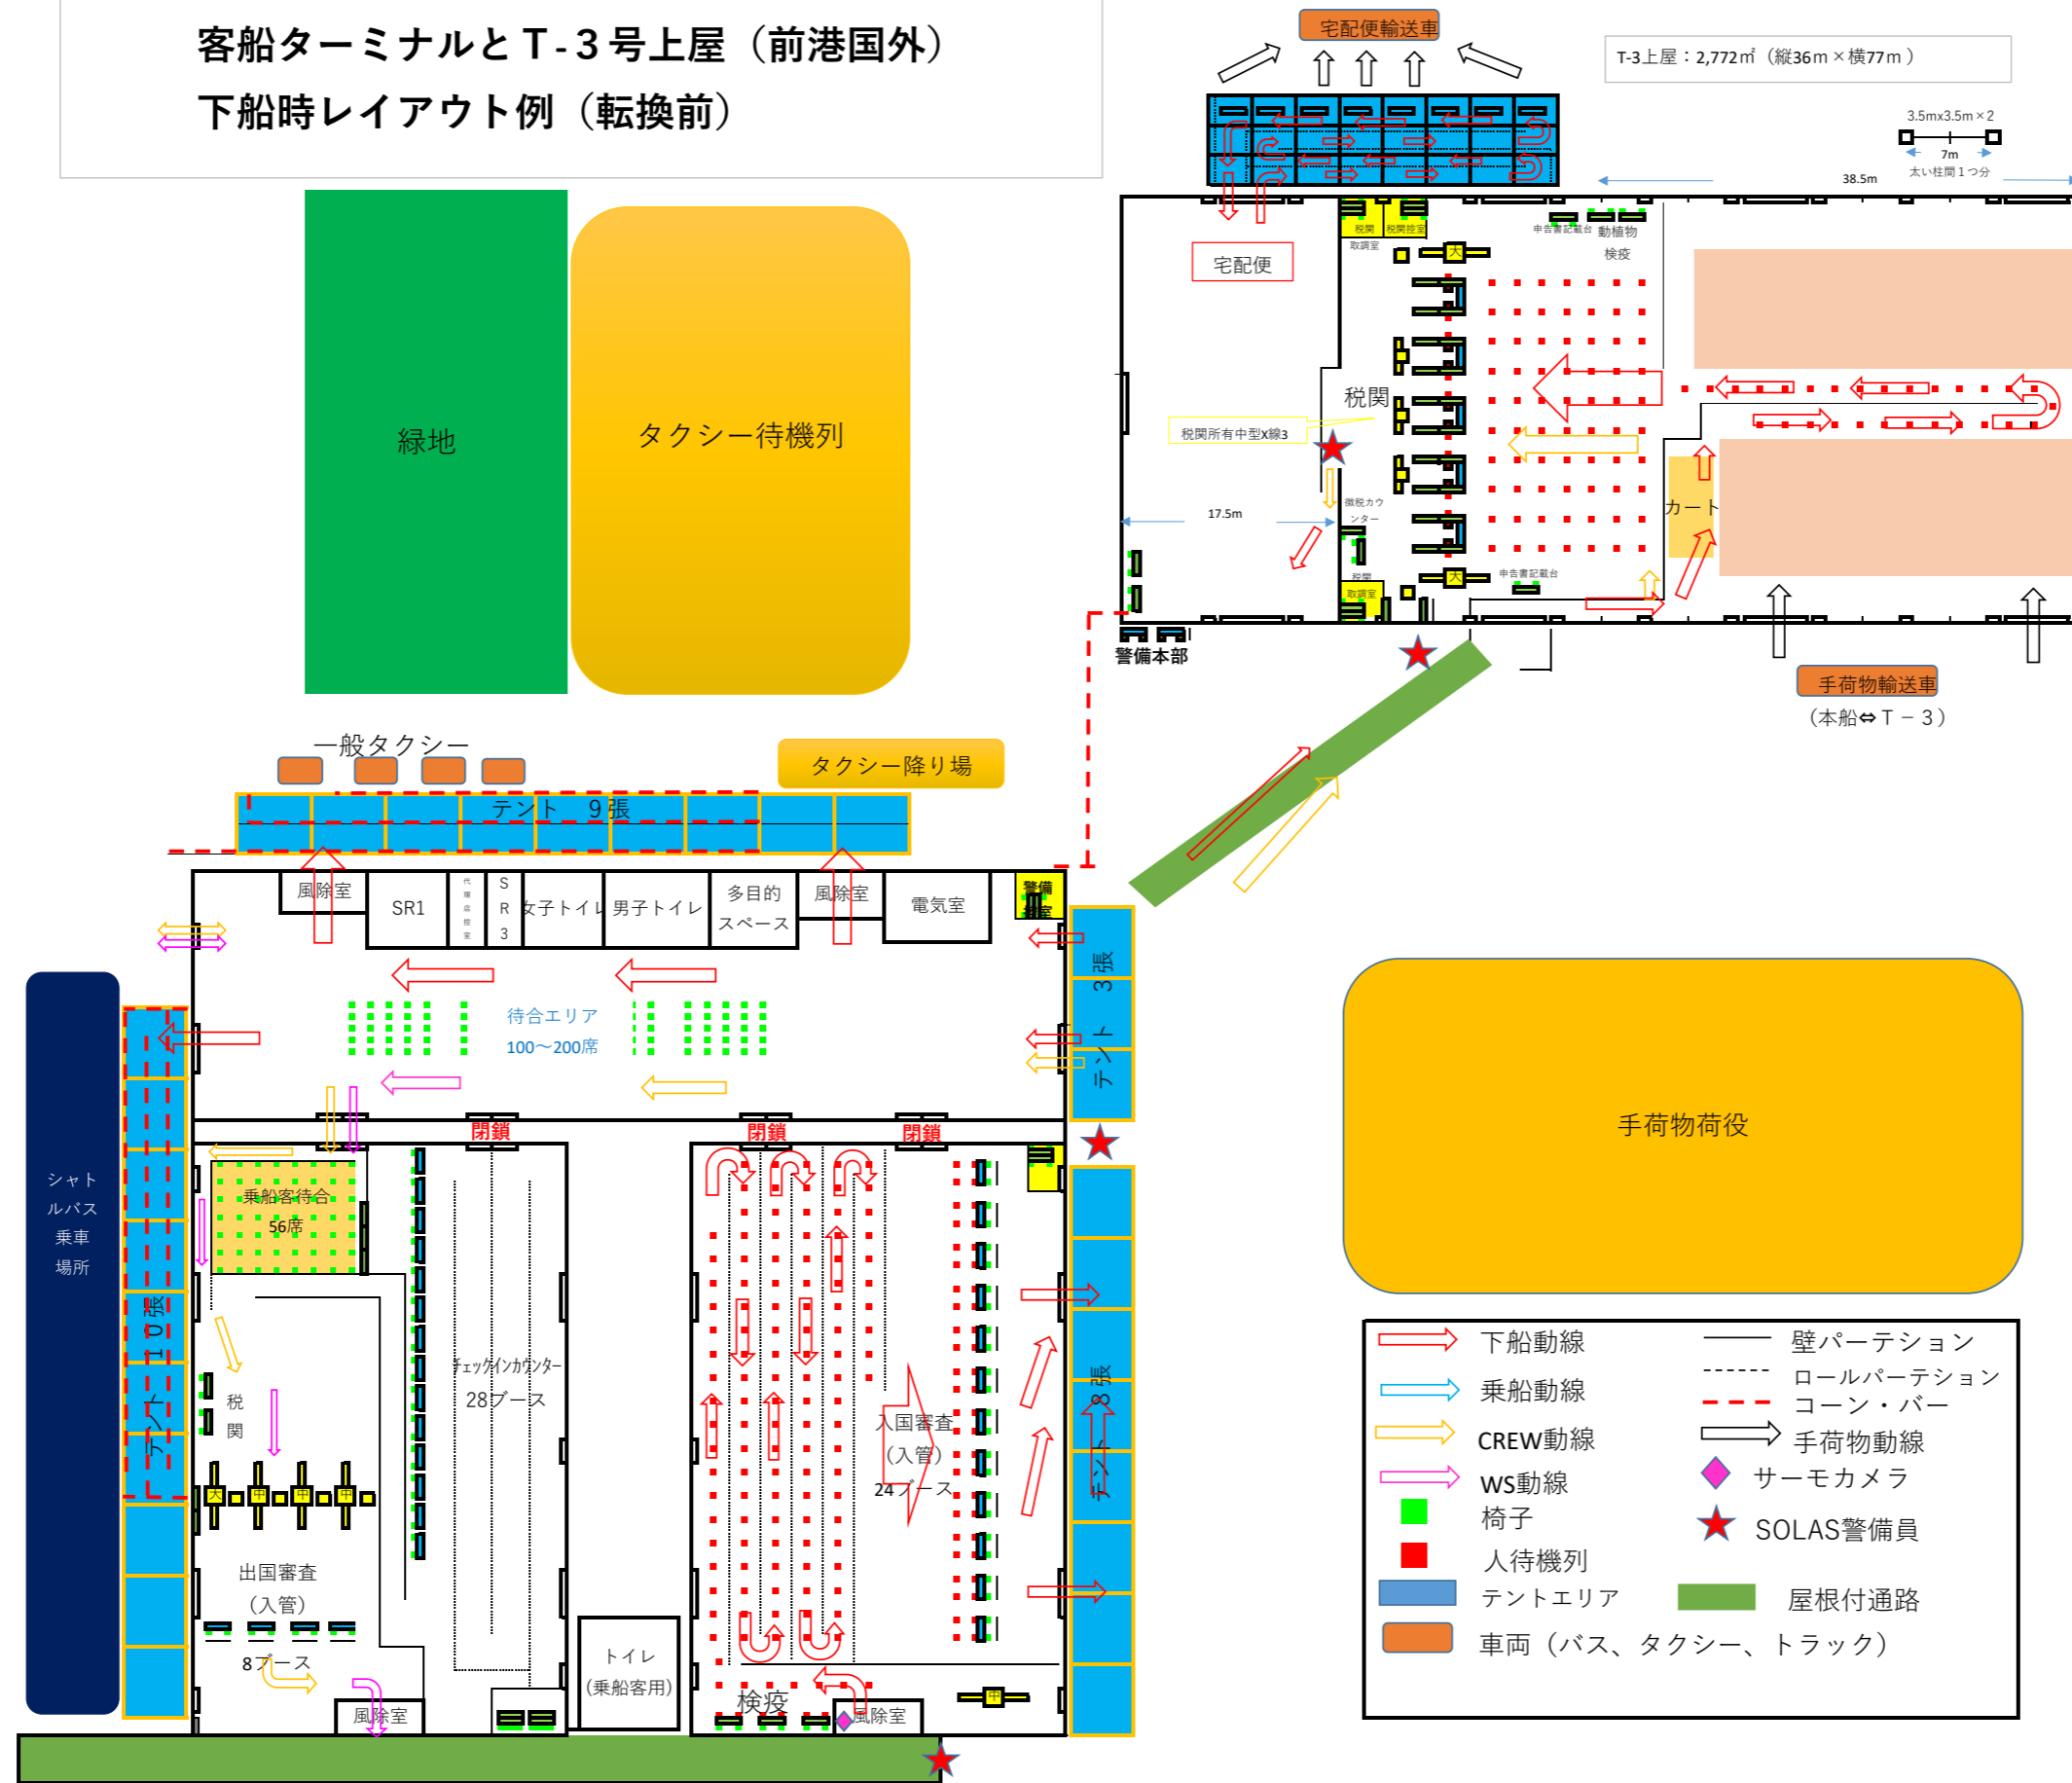

客船ターミナルとT-3号上屋（前港国外）
乗船時レイアウト例（転換後）

